Id	Task Name	Miljø	Varighed	Early Start	Early Finish
1	**eTL - Releaseplan**		**227,14 dage**	**on 02-01-08**	**fr 21-11-08**
2	**Release 0**		**114,14 dage**	**on 02-01-08**	**ti 17-06-08**
3	Udvikling	Udvikling	86 dage	on 02-01-08	ti 06-05-08
5	CSC test	CSC test	5 dage	to 08-05-08	fr 16-05-08
7	Fællestest - Kommunikationstest	Fælles test	2 dage	ti 20-05-08	on 21-05-08
8	Fællestest - Meddelelsestest	Fælles test	5 dage	to 22-05-08	on 28-05-08
9	Fællestest - Prefunktionstest	Fælles test	13 dage	to 29-05-08	ti 17-06-08
10	**Release 1**		**146 dage**	**on 02-01-08**	**to 31-07-08**
11	Udvikling	Udvikling	97 dage	on 02-01-08	to 22-05-08
13	CSC test	CSC test	10 dage	ti 27-05-08	on 11-06-08
15	DSS test	DSS test	29 dage	fr 20-06-08	to 31-07-08
17	Fællestest - Meddelelsestest	Fælles test	4 dage	to 26-06-08	ti 01-07-08
18	Fællestest - Prefunktionstest	Fælles test	5 dage	on 02-07-08	ti 08-07-08
19	**Release 1a**		**60 dage**	**on 07-05-08**	**to 31-07-08**
20	Udvikling	Udvikling	23 dage	on 07-05-08	ti 10-06-08
22	CSC test	CSC test	14 dage	to 19-06-08	ti 08-07-08
24	Fællestest - Kommunikationstest	Fælles test	2 dage	on 16-07-08	to 17-07-08
25	Fællestest - Meddelelsestest	Fælles test	4 dage	fr 18-07-08	on 23-07-08
26	Fællestest - Prefunktionstest	Fælles test	6 dage	to 24-07-08	to 31-07-08
27	**Release 2**		**116,14 dage**	**ti 01-04-08**	**fr 12-09-08**
28	Udvikling	Udvikling	57 dage	ti 01-04-08	ma 23-06-08
30	CSC test	CSC test	32 dage	to 26-06-08	ma 11-08-08
32	DSS test	DSS test	26 dage	ti 05-08-08	on 10-09-08
34	Fællestest - Meddelelsestest	Fælles test	5 dage	on 06-08-08	ti 12-08-08
35	Fællestest - Prefunktionstest	Fælles test	23 dage	on 13-08-08	fr 12-09-08
36	**Release 3**		**141 dage**	**ti 01-04-08**	**fr 17-10-08**
37	Udvikling	Udvikling	92 dage	ti 01-04-08	ma 11-08-08
39	CSC test	CSC test	19 dage	to 14-08-08	on 10-09-08
41	DSS test	DSS test	16 dage	ma 15-09-08	ti 07-10-08
43	Fællestest - Ekstern funktionstest	Fælles test	16 dage	to 25-09-08	fr 17-10-08
44	**Release 4**		**99,14 dage**	**ma 23-06-08**	**fr 07-11-08**
45	Udvikling	Udvikling	58 dage	ma 23-06-08	to 11-09-08
47	CSC test	CSC test	21 dage	ma 15-09-08	ti 14-10-08
49	DSS test	DSS test	13 dage	on 15-10-08	ma 03-11-08
51	Fælles test - regressionstest	Fælles test	7 dage	ma 27-10-08	ti 04-11-08
53	Performancetest	Produktion	14 dage	to 16-10-08	ti 04-11-08
54	Installationsprøve	Produktion	3 dage	on 05-11-08	fr 07-11-08
55	**Konvertering**		**184,14 dage**	**ma 03-03-08**	**fr 21-11-08**
56	Udvikling og test af version 1	Udvikling	124 dage	ma 03-03-08	fr 29-08-08
57	Udvikling og test af version 2	Udvikling	86 dage	ma 09-06-08	ma 06-10-08
58	Prøvekonvertering		26 dage	ti 07-10-08	ti 11-11-08
59	Produktionskonvertering	Produktion	3 dage	on 19-11-08	fr 21-11-08
60	**Go Live**	**Produktion**	**0 dage**	**fr 21-11-08**	**fr 21-11-08**

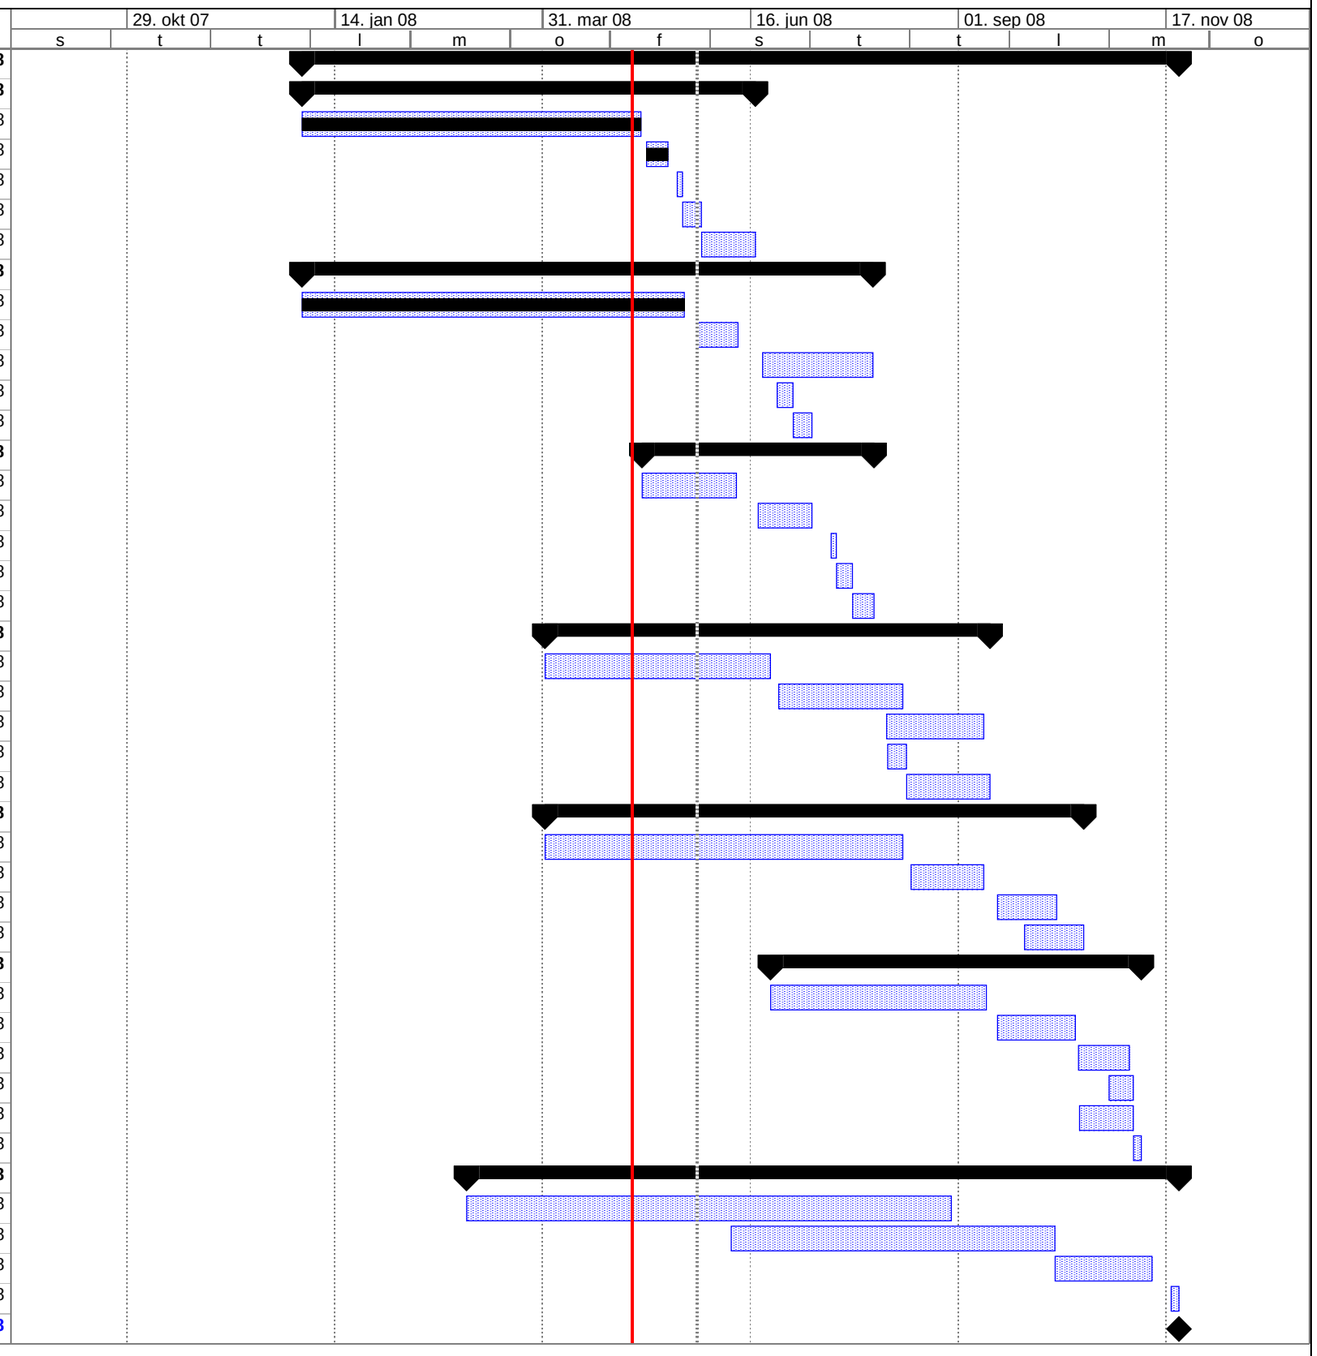

Project: P8713
Date: ti 27-05-08
